


Geplande werkzaamheden 2025–2030

In Benthuizen worden de komende jaren diverse werkzaamheden uitgevoerd door de gemeente, die impact op elkaar hebben en soms afhankelijk zijn van besluiten en beleid.

Locatie

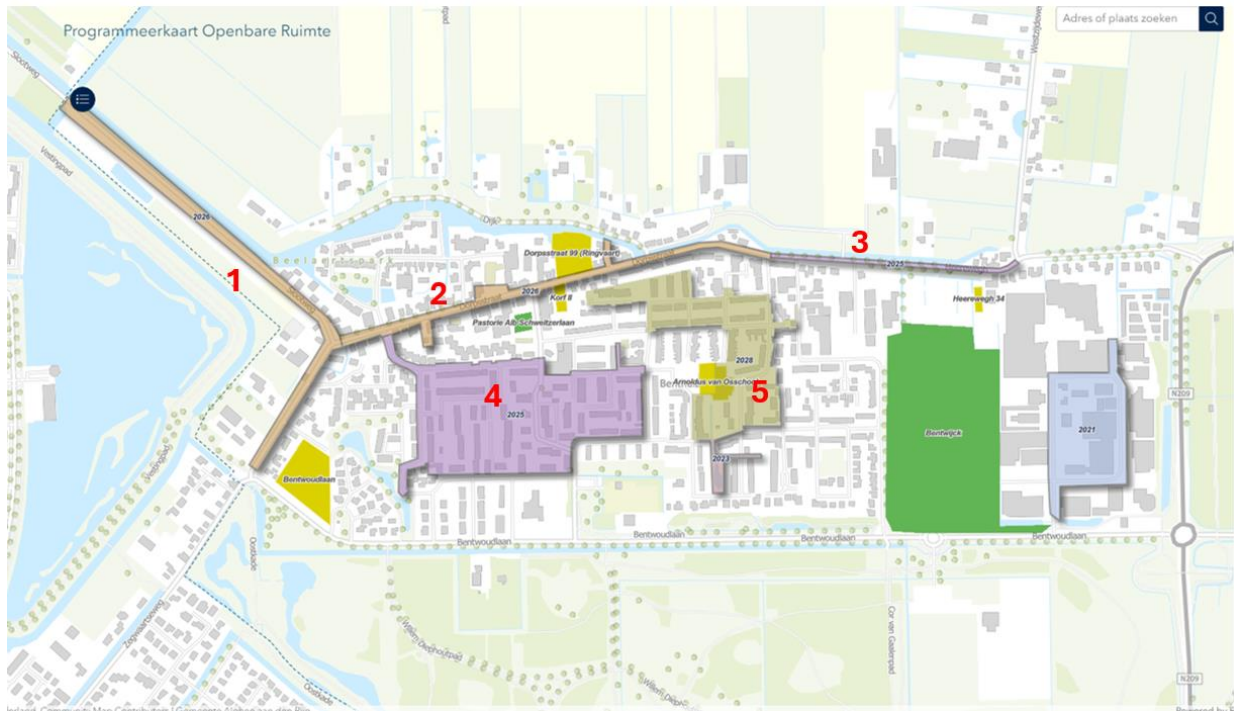

De cijfers geven niet de volgorde van de werkzaamheden aan.

1. 2024 fietsstroken (coating) aanbrengen GOW30, Rijnland gaat medio 2025 het noordwestelijkdeel tot de Dorpsstraat ophogen, daarna wens in te richten als GOW30 met fietsstroken en streetprint. Mogelijk meeliften met werk Dorpsstraat.
2. Reconstructie Dorpsstraat incl. riolering, bovengrondse inrichting, veel participatie en complex met bereikbaarheid. Afhankelijk van visie verkeerssituatie (mogelijk knip maken, 1-richtingsverkeer e.d. dat weer grotere impact heeft dan deze projectscope). Uitvoering vermoedelijk medio 2027, e.e.a. afhankelijk van k&l, impact omgeving e.d.

Toelichting start 2027:

Dorpsstraat start in 2025 jaar als project, dit is het participatiegedeelte en voorbereiding. Uitvoering start medio 2027, afhankelijk van de snelheid van de

voorbereiding. Als gevolg van de werkzaamheden/planning van werkzaamheden kabels en leidingen is een start in 2026 niet reeel. Exacte planning werken we verder uit.

3. Groot onderhoud Heereweg (GOW30 inrichting) uitvoering 2025, volgt nog een bewoners informatieavond
4. Oranjebuurt West, reconstructie incl. riolering, project is in voorbereiding, uitvoering medio 2027.
5. Reconstructie Christinastraat e.o., incl. riolering. Start werk na gereedkomen Arnoldus van Os en mogelijk na Dorpsstraat, sowieso na Oranjebuurt West, niet voor 2028 in uitvoering

Geplande woningbouw projecten, (planning nog niet bekend)

- Bentwoudlaan (7x huurwoningen)
- Pastorie Albert Schweitzerlaan (14 huurwoningen)
- Korf II (28 woningen)
- Dorpsstraat 99, Ringvaart (37 woningen)
- Arnoldus van Os (29 woningen)
